

运维服务事业部 新能源资产项目试运营期管理指引

一、目的

为规范新中标项目进场后 30 天试运营期标准化管理动作，明确项目转入正常运营期的判定标准与流程，通过建立 PMO（项目管理办公室）主导的纠偏机制，联动技术管理部、产品管理部、经营管理部等责任主体，确保项目达成合同约定的履约指标、成本控制目标及客户满意度要求，实现项目从建设到运营平稳过渡，降低运营风险，保障资产全生命周期收益，特制定本指引。

二、适用范围

本指引适用于公司事业部下属所有新中标的项目，涵盖项目正式进场之日起至第 30 个自然日（定义为“试运营期”）的全流程管理工作。

适用对象包括：项目场站负责人、子公司/区域交付中心管理层、PMO。涉及试运营期标准化动作管控、成本核查、客户对接、达标判定及偏差纠偏等所有相关工作。

三、组织职责

明确试运营期各责任主体的核心职责，确保分工清晰、协同高效，聚焦 PMO 核心管理职能，具体如下：

（一）项目

1. 严格执行试运营期标准化动作清单，落实各项标准化管理要求；
2. 试运行期间，项目收集的运维相关数据、成本偏差明细及客户问题反馈等，在《进场交付标准化动作》表单中每日更新，确保数据真实、准确、及时；
3. 对试运营期内发现的异常情况进行初步分析，及时上报至子公司/区域中心

及 PMO，并组织研讨制定纠偏措施，严格按照审定后的纠偏措施执行。

4. 汇总试运营期各项数据、初步判定结果，根据结果申请进入项目正式运营期。

（二）子公司/区域交付中心

1. 协调子公司/区域交付中心内技术、人员、物资等资源，为项目试运营及纠偏工作提供支撑；协助项目对接客户，并解决项目试运营期的各类协调问题；

2. 监督辖区内新中标项目试运营期各项工作的执行情况，确保标准化动作落地到位；

3. 初步审核项目提交的试运营数据及试运营总结报告，核实数据真实性，对异常数据及时预警并同步至 PMO；

4. 配合 PMO 开展试运营期达标判定及偏差纠偏工作，跟踪整改措施的落地进度，督促项目及时向 PMO 反馈整改进展。

（三）事业部交付管理部（PMO）

1. 负责本指引的落地执行、解释及更新，规范试运营期 PMO 各项管理行为；

2. 制定试运营期管理标准、考核指标及判定标准，未转"线上管理"期间搭建试项目运营期监测台账；

3. 监督各责任主体在试运营期的工作落实情况，确保各项标准化动作、管理要求落地到位。全程监测试运营期项目关键指标完成情况、成本投入、客户满意度等存在的偏差，及时发现异常并预警；

4. 当试运营期出现异常情况时，触发异常纠偏流程，所有纠偏相关操作均在

OA 系统的产品移交交付流程上完成，通过该流程驱动技术管理部、产品管理部、经营管理部介入纠偏，同步跟踪纠偏进度及效果，实现纠偏流程的线上化、自动化闭环管理；

5. 牵头组织试运营期达标判定全流程工作，出具判定结果，明确项目是否具备进入“正常运营期”的条件；

四、管理要求

（一）试运营期核心管控维度

PMO 需重点监控以下三大维度，作为项目进入正常运营期的核心判定依据：

1. 合同指标达成率：此处合同指标指产品管理部在解决方案阶段根据招标文件标定的合同指标（如故障频次、平均故障处理小时数、综合厂用电率等），项目无重大指标未达标情形。

2. 成本偏差控制：对比项目实际投入资源与解决方案设计阶段既定资源的数量、类型是否存在重大偏差，并将试运营期实际发生成本（含人力、运维耗材、外委服务等）与方案设计阶段对应成本比对，确保无重大非计划性资本支出。

3. 客户满意度：无重大客户投诉及索赔事件；客户方对项目运维履约达标、服务响应及时高效、流程规范可溯、沟通对接顺畅等方面均表示认可，项目初步运行效果在客户满意度问卷中获得良好评价，满意度评分 ≥ 80 分（满分 100 分）

（二）标准化管理动作（前 30 天）

试运营期 30 天按阶段划分，明确各阶段核心标准化动作，确保有序推进：

1. Day1-3 天（客户对接期）：

①项目组织与客户召开入场交接会；

②PMO 督促项目按期开会，审核会议纪要，核实项目负责人对项目基本情况、运维状况是否摸底清楚。

③输出：《交接会会议纪要》

2. Day4-7（计划制定期）：

①项目进行交付资源匹配及交付计划制定；

②PMO 督促项目依据立项会中的工作排布、风险解决方案、和进场交底会纪要中客户的要求按时编制《试运行双周工作计划》，并审核实际执行合理性；

③输出：《试运行双周工作计划》。

3. Day8-27（计划试运行期）：

①项目依照双周计划执行，以及试运行评估；

②PMO 接收现场每日工作汇报，监督项目计划执行进度、闭环情况，以及异常问题是否按照纠偏措施进行动态纠偏。

③输出：《设备体检报告》《资料收集清单》

4. Day28-30（阶段性复盘）：

①项目发起召开阶段性复盘会；

②PMO 督促项目按期召开会议，引导项目负责人围绕立项会风险解决方案执行情况、合同偏差情况、客户满意度情况、以及运维过程中新增的风险等内容，完成复盘报告；并研判项目是否具备正式运维条件，完成达标判定工作。（如和立项会交接内容偏差较大则组织区域、营销、产品共同研判）

③输出：《试运行评估报告》

（三）进入正常运营期判定规则

1. 通过：三项核心管控维度均达标，或次要指标存在微小偏差但已制定并经客户认可的后续整改计划。PMO 线上审批项目正式进入正常运营期。

2. 不通过：任一核心管控维度严重不达标且未在 30 天内完成有效纠偏。项目延长试运营期（最长不超过 15 天）。

（四）资料归档要求


试运营期结束后，PMO 汇总以下资料，归档至事业部钉盘指定位置，留存备查（转线上管理后在系统上自动归档）：


1. 《交底会会议纪要》
2. 《资料收集清单》
3. 《设备体检报告》
4. 《客户满意度调查》
5. 《试运行评估报告》

五、管理流程

本流程明确试运营期（前 30 天）PMO 管理全流程，涵盖前期准备、过程管控、达标判定、纠偏闭环等环节，核心突出“平台驱动、流程自动化”模式，所有 PMO 触发的纠偏操作均在 OA 系统的产品移交交付流程上完成，明确各责任主体的线上操作节点及衔接关系，实现纠偏流程线上化、自动化、可追溯，确保流程规范、高效可落地。

(一) 试运营期 PMO 管理流程图

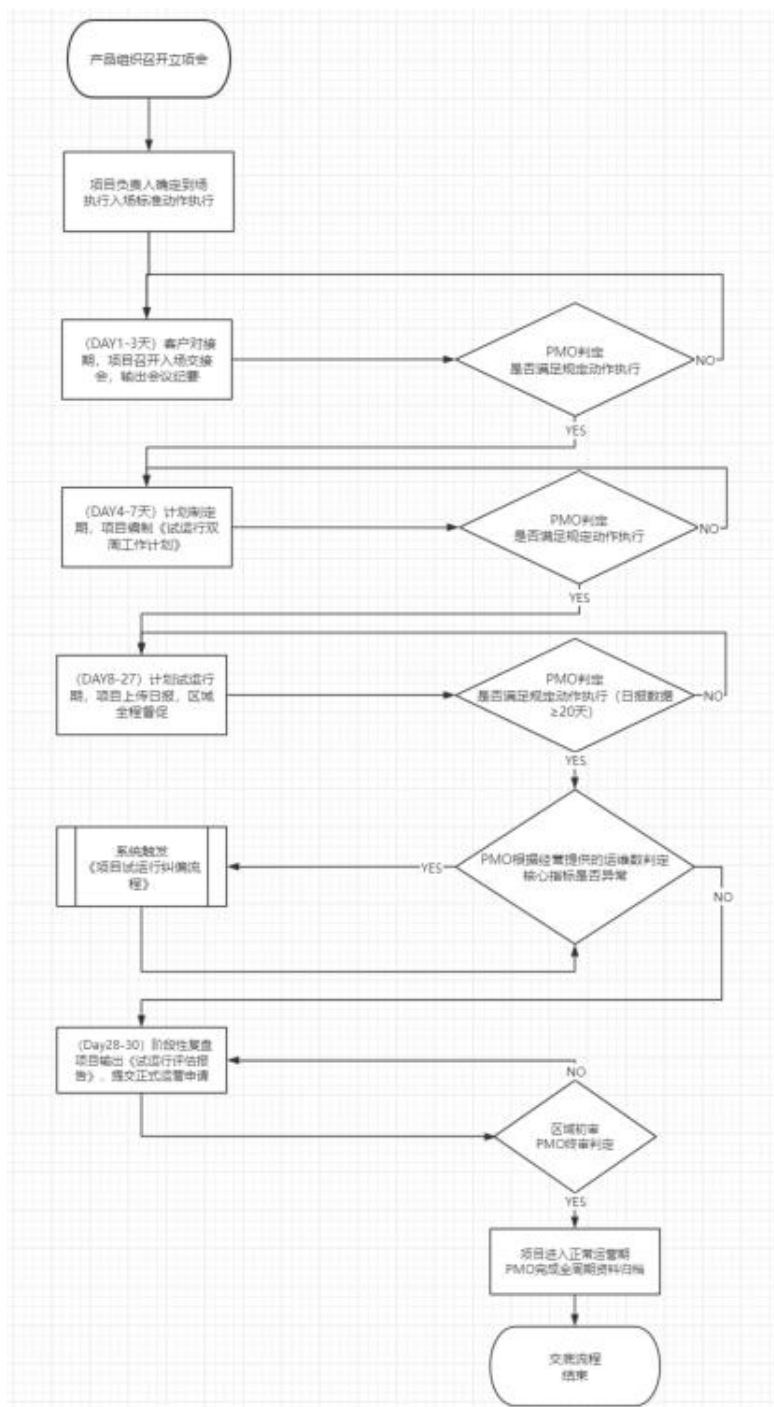



编制说明

本指引由事业部交付管理部（PMO）负责解释与修订，自发布之日起执行。各区域中心及项目需组织全员培训，确保所有相关人员理解并落实本指引相关要求。
